Specialized Consulting Firm in Data & Al Cloud System

Data & BI

Big Data & AI

Data Flow & Automation

Data Infra & Security

# 필립모리스코리아 Cloud Migration 완료 보고서







- 1. 프로젝트 추진 배경
- 2. 프로젝트 경과 보고
- 3. 프로젝트 결과 요약


- 1. 프로젝트 추진 배경
- 2. 프로젝트 경과 보고
- 3. 프로젝트 결과 요약



#### 1-1. Cloud Migration 프로젝트 추진 목표

본 프로젝트는 On-premises 서버를 Cloud로 이관하고 이에 따라 기존 시스템을 보다 향상된 성능과 확장성을 제공하는 목표와 클라우드 이관을 통해 선별적으로 주요 데이터의 클렌징을 진행하여 최적화된 상태로 조성하는 것을 목표로 삼았습니다. 따라서 1) 클라우드 이관 2) 연결정보 변경 3) Power BI 개발을 통하여 기존 시스템을 유지하면서도 확장 가능한 솔루션으로 변화시키고자 했습니다.

#### 1. 클라우드 이관 - Cloud Migration (On-premises to Cloud)

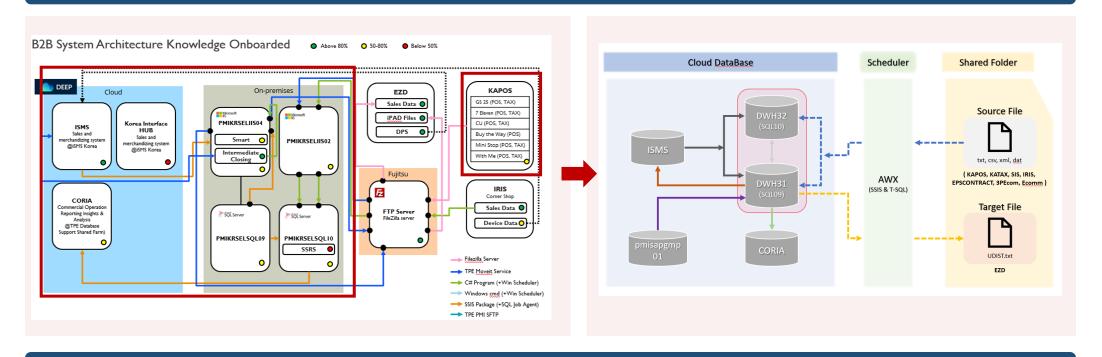

#### 2. 클라우드 이관에 따른 연결정보 변경 - CORIA DW & Power BI Connection

#### 3. Power BI 개발 - SSRS Report to Power BI




## 1-1. Cloud Migration 프로젝트 추진 목표

본 프로젝트는 On-premises 서버를 Cloud로 이관하고 이에 따라 기존 시스템을 보다 향상된 성능과 확장성을 제공하는 목표와 클라우드 이관을 통해 선별적으로 주요 데이터의 클렌징을 진행하여 최적화된 상태로 조성하는 것을 목표로 삼았습니다. 따라서 1) 클라우드 이관 2) 연결정보 변경 3) Power BI 개발을 통하여 기존 시스템을 유지하면서도 확장 가능한 솔루션으로 변화시키고자 했습니다.

#### 1. 클라우드 이관 - Cloud Migration (On-premises to Cloud)

#### 2. 클라우드 이관에 따른 연결정보 변경 - CORIA DW & Power BI Connection

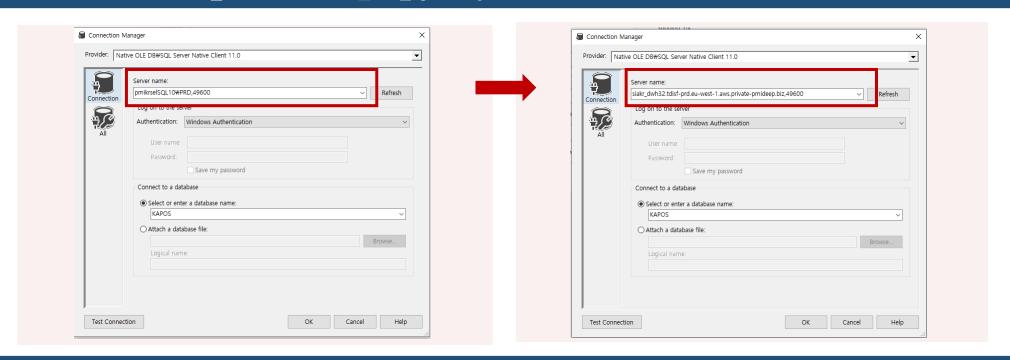

#### 3. Power BI 개발 - SSRS Report to Power BI




#### 1-1. Cloud Migration 프로젝트 추진 목표

본 프로젝트는 On-premises 서버를 Cloud로 이관하고 이에 따라 기존 시스템을 보다 향상된 성능과 확장성을 제공하는 목표와 클라우드 이관을 통해 선별적으로 주요 데이터의 클렌징을 진행하여 최적화된 상태로 조성하는 것을 목표로 삼았습니다. 따라서 1) 클라우드 이관 2) 연결정보 변경 3) Power BI 개발을 통하여 기존 시스템을 유지하면서도 확장 가능한 솔루션으로 변화시키고자 했습니다.

#### 1. 클라우드 이관 - Cloud Migration (On-premises to Cloud)

#### 2. 클라우드 이관에 따른 연결정보 변경 - CORIA DW & Power BI Connection

#### 3. Power BI 개발 - SSRS Report to Power BI

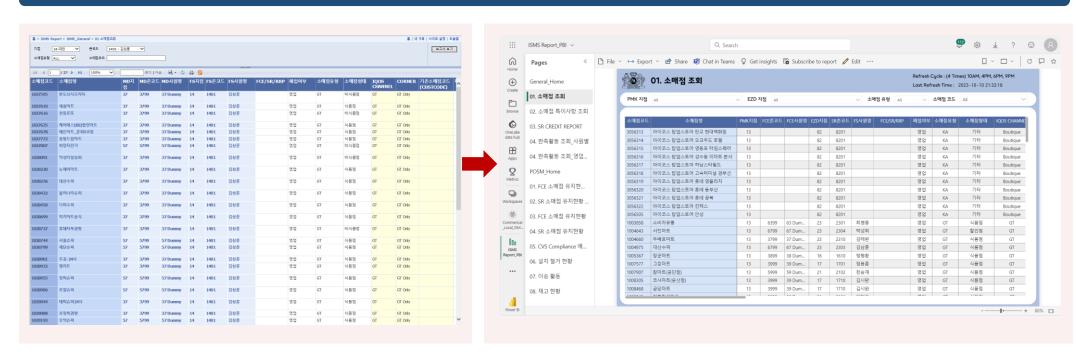

- 1. 프로젝트 추진 배경
- 2. 프로젝트 경과 보고
- 3. 프로젝트 결과 요약

#### 2-1. 프로젝트 범위 및 수행인력

#### 프로젝트 범위

프로젝트 영역

- 1. Cloud Migration 부문
- ① On-Premises -> Cloud 이관
- ② 후지쯔 서버 통한 외부파일 재개발(KAPOS 등)
- 2. Connection 변경 부문
- ① CORIA DW 적재 SSIS package 변경
- ② Power BI Connection 변경
- 3. Bl Report 개발
- ① SSRS report + SMART(판촉활동조회)위해 DW구축 및 BI 개발


- 1. GENERAL Report
  - 소매점 조회


- 소매점 특이사항 조회
- SR CREDIR REPORT
- 판촉활동조회
- 2. POSM Report 대상 보고서
  - FCE 소매점 유지 현황 Pri SR 소매점 유지 현황 Pri
  - FCE 소매점 유지 현황
- SR 소매점 유지 현황
- CVS Compliance
- 설치 철거 현황

- 이송 활동

- 재고 현황

#### 수행 조직도

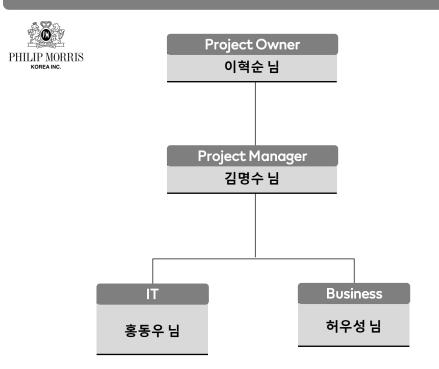

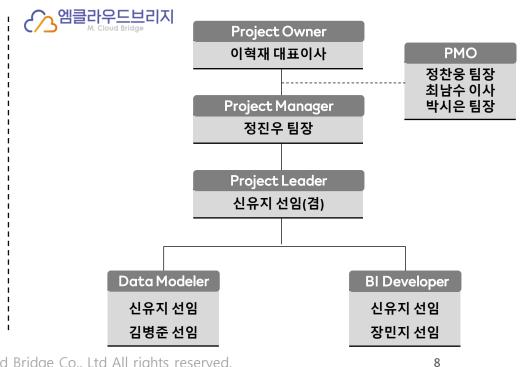



## 2-2. 클라우드 이관 - Cloud Migration (On-premises to Cloud) 방법론

- ❖ 클라우드 이관의 현황
  - 기업들은 여러 이유로 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 인프라로 전환합니다. 클라우드의 무한한 스토리지를 활용하려는 목적을 기반으로 보다 유연한 작업 환경을 구성하는 것과 같은 특정 목적을 동반합니다.
  - 대부분 클라우드 이관을 통해 기대하는 주요 이점은 다음과 같습니다. 성능 및 민첩성 향상, 탄력성과 확장성 활용, 비용 효율성 등이며 이를 위해 신중하게 계획하여 클라우드 이관을 진행합니다.
- ❖ 서버 마이그레이션 일반적인 방법론 안내

분석	설계	구축	검증	이관
■ 비즈니스 전략 및 계획	■ 아키텍쳐 설계	■ 인프라 구축	■ 시스템 검증	■ 이관
	Infra 설계	Network 구축	이중화 및 부하 검증	환경에 맞춰 효율적인 방
■ 시스템 현황 분석	리소스 용량 설계	방화벽		법을 이용하여 클라우드
시스템 사양, OS현황	아키텍처 검증	Storage 구축		이관
시스템 리소스 사용률	보안 설계	Server, App 구축	■ 서비스 검증	
시스템 설정 현황 등			기능 및 성능 검증	■ 안정화 운영
	<ul><li>Migration 설계</li></ul>	<ul><li>Migration 수행</li></ul>		운영 및 모니터링 진행
■ 기존 시스템 종료 계획	데이터, 프로시저,	데이터, 프로시저,		
복제, 삭제 항목을 나누어	Job schedule 등	Job schedule 등		
검토하고 이를 기반으로	Migration 계획 설계	Migration 수행		
도입-전환 로드맵 구축				



## 2-2. 프로젝트 추진 일정 상세



WBS

본 프로젝트는 기존 시스템 환경과 자료 분석을 시작으로 DEV - QA - PRD 순으로 이관 작업을 진행하고, 관련된 시스템들을 추적하여 연결정보를 수정하거나 전환 개발을 통하여 이관된 클라우드 환경을 유연하게 사용할 수 있도록 개발을 진행해왔습니다.

Project Progress Date			Project Progress Status			
Project Progress Dute		Total Prog	93%			
Start Date	2023-06-12	Tabel 95 Davis		Task Total	79 EA	
End Date	23/10/13 (금)	Total 85 Days	Task Count	Completed	74 EA	
Focus on Date	23/10/11 ( <i>수</i> )	Passed by 83 Days		In-Progress	4 EA	
		Remain 2 Days		Open	1 EA	

Project Task		Plan Schedule		Actual Schedule			ProgressStatus			
Leve	Last_l 🚽	4- 4- 4- 4- 4- L5	P.StartDate 🐷	P.Period 🕌	P.EndDate 🐷	A.StartDate 🕌	A.Period 🕌	A.EndDate 🐷	Percentage 🐷	Status
1	N	1. 은프레미스 ODS 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션	23/06/12 (월)	75	23/09/25 (월)	23/06/19 (월)	70	23/09/25 (월)	O 100%	Completed
2	N	1-1. On-Prem ODS(PROD #09) 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션	23/06/12 (월)	55	23/08/28 (월)	23/06/19 (월)	69	23/09/22 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-1-1. On-Prem ODS(PROD #09) 분석(마이그레이션 범위 설정)	23/06/12 (월)	20	23/07/07 (금)	23/06/19 (월)	15	23/07/07 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-1-2. On-Prem ODS(PROD #09) 응용프로그램 분석/범위 설정	23/07/10 (월)	20	23/08/04 (금)	23/07/10 (월)	10	23/07/21 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-1-3. On-Prem ODS(PROD #09) Cloud(AWS) DEV서버 마이그레이션 개발	23/07/20 (목)	12	23/08/04 (금)	23/07/10 (월)	20	23/08/04 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-1-4. On-Prem ODS(PROD #09) 응용프로그램 Cloud(AWS) DEV서버 마이그레이션 개발	23/07/13 (목)	17	23/08/04 (금)	23/07/13 (목)	24	23/08/16 (수)	0 100%	Completed
3	N	1-1-5. Cloud(AWS) QA서버 배포/검증 (UAT)	23/08/07 (월)	15	23/08/28 (월)	23/08/11 (금)	19	23/09/07 (목)	0 100%	Completed
3	N	1-1-6. Cloud(AWS) 응용프로그램의 QA서버 배포/검증 (UAT)	23/08/07 (월)	15	23/08/28 (월)	23/08/16 (수)	28	23/09/22 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-1-7. Cloud(AWS) QA서버의 PRD서버 배포	23/09/11 (월)	11	23/09/25 (월)	23/09/06 (수)	14	23/09/25 (월)	0 100%	Completed
2	N	1-2. On-Prem ODS(PROD #10) 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션	23/06/12 (월)	55	23/08/28 (월)	23/06/19 (월)	68	23/09/21 (목)	0 100%	Completed
3	N	1-2-1. On-Prem ODS(PROD #10) 분석(마이그레이션 범위 설정)	23/06/12 (월)	20	23/07/07 (금)	23/06/19 (월)	15	23/07/07 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-2-2. On-Prem ODS(PROD #10) 용용프로그램 분석/범위 설정	23/07/10 (월)	20	23/08/04 (금)	23/07/10 (월)	11	23/07/24 (월)	0 100%	Completed
3	N	1-2-3. On-Prem ODS(PROD #10) Cloud(AWS) DEV서버 마이그레이션 개발	23/07/20 (목)	12	23/08/04 (금)	23/07/10 (월)	20	23/08/04 (금)	0 100%	Completed
3	N	1-2-4. On-Prem ODS(PROD #10) 용용프로그램 Cloud(AWS) DEV서버 마이그레이션 개발	23/07/13 (목)	17	23/08/04 (금)	23/07/13 (목)	24	23/08/16 (수)	0 100%	Completed
3	N	1-2-5. Cloud(AWS) DEV서버의 QA서버 배포/검증 (UAT)	23/08/07 (월)	15	23/08/28 (월)	23/08/11 (금)	19	23/09/07 (목)	0 100%	Completed
3	N	1-2-6. Cloud(AWS) DEV서버 응용프로그램의 QA서버 배포/검증 (UAT)	23/08/07 (월)	15	23/08/28 (월)	23/08/16 (수)	27	23/09/21 (목)	0 100%	Completed
3	N	1-2-7. Cloud(AWS) QA서비의 PRD서비 배포	23/09/11 (월)	11	23/09/25 (월)	23/09/08 (금)	12	23/09/25 (월)	0 100%	Completed
1	N	2. Cloud(DEEP) CORIA DW/DM Connection 수정 개발	23/08/14 (월)	19	23/09/08 (금)	23/07/17 (월)	33	23/08/31 (목)	0 100%	Completed
2	N	2-1. CORIA DW Connection 수정 개발	23/08/14 (월)	19	23/09/08 (금)	23/08/21 (월)	9	23/08/31 (목)	0 100%	Completed
3	N	2-1-1. Cloud(DEEP)서버 SSIS Package 수정 개발 - QA 소스	23/08/14 (월)	19	23/09/08 (금)	23/08/21 (월)	9	23/08/31 (목)	0 100%	Completed
3	N	2-1-1. Cloud(DEEP)서버 SSIS Package 수정 개발 - PRD 소스	23/09/18 (월)	10	23/10/04 (수)	23/09/08 (금)	12	23/09/25 (월)	0 100%	Completed
1	N	3. 은프레미스 ODS서버 SSRS Report Power BI 전환 개발	23/07/17 (월)	60	23/10/13 (금)	23/07/17 (월)	56	23/10/06 (금)	0 100%	Completed
2	N	3-1. 1차 모델링 개발 및 DW 구축	23/07/17 (월)	25	23/08/21 (월)	23/07/17 (월)	55	23/10/05 (목)	0 100%	Completed
3	N	3-1-1. 기존 SSRS Report 분석	23/07/17 (월)	10	23/07/28 (금)	23/07/17 (월)	16	23/08/07 (월)	0 100%	Completed
3	N	3-1-2. Cloud(DEEP)서버 SSIS Package 추가 개발 (DW 내 추가 개발)	23/07/31 (월)	15	23/08/21 (월)	23/08/01 (화)	44	23/10/05 (목)	0 100%	Completed
2	N	3-2. 2차 모델링 개발 및 DM 구축	23/08/21 (월)	30	23/10/04 (수)	23/08/21 (월)	31	23/10/05 (목)	0 100%	Completed
3	N	3-2-1. Cloud(DEEP)서버 SSAS Package 신규 개발	23/08/21 (월)	30	23/10/04 (수)	23/08/21 (월)	31	23/10/05 (목)	0 100%	Completed
2	N	3-3. 3차 모델링 개발 및 Power BI Visualization	23/08/21 (월)	36	23/10/13 (금)	23/08/23 (수)	30	23/10/06 (금)	O 88%	In-Progress
3	N	3-3-1. Power Bi Report 개발	23/08/21 (월)	36	23/10/13 (금)	23/08/23 (수)	30	23/10/06 (금)	O 88%	In-Progress
1	N	4. 은프레미스 ODS서버 Cloud Migration 관련 Hyper Care	23/09/25 (월)	11	23/10/13 (금)	23/09/25 (월)	9		18%	In-Progress
2	N	4-1. Hyper Care (운영 및 모니터링)	23/09/25 (월)	11	23/10/13 (금)	23/09/25 (월)	9		O 18%	In-Progress
3	N	4-1-1. 프로젝트 산출물 점검/인수인계	23/10/02 (월)	7	23/10/12 (목)	23/10/04 (수)	5		O 5%	In-Progress
3	N	4-1-2. 운영 및 모니터링	23/09/25 (월)	11	23/10/13 (금)	23/09/25 (월)	9		0 30%	In-Progress

- 1. 프로젝트 추진 배경
- 2. 프로젝트 경과 보고
- 3. 프로젝트 결과 요약



#### 3-1. 클라우드 이관 - Cloud Migration (On-premises to Cloud) 결과

#### Migration 준비

• On-Prem의 스케쥴링으로

돌아가는 SSIS, T-SQL,

powershell 등 분석

• Cloud DEV 환경에 맞게 분 석한 솔루션들 개발

**DEV** 

- 사용하지 않는 DB, Table 정리(rename)
- 새로 개발한 SSIS 테스트

• DEV 개발 테스트

QA

- 외부 서버 연결 최종 테스트
- 권한 최종 정리(IMDL 등)
- GETDATE 함수 정리

- **PRD**
- 클라우드 이관 9/22 ~ 25
- Movelt 동시 수정개발 진행
- AWX 스케쥴링

모니터링

• 데이터 이슈 대응

#### SQL10 (12개) -> DWH32 (8개)

#### **Database** Server Database CMRRPT DWH32 SQL10 ACK KR SQL10 CMRRPT DWH32 COMMONR SQL10 COMMONR DWH32 ISMSR DWH32 ISMSRRP SQL10 ISMSR DWH32 KAPOS SQL10 ISMSRRP KAPOS PMK CDW SQL10 DWH32 PMK\_IRIS SQL10 PMK\_CDW DWH32 TMP\_POS SQL10 PMK CRS SQL10 PMK IRIS SQL10 ReportServer

## SQL09 (31개) -> DWH31 (12개)

	Server	Database
	DWH31	BPDA
	DWH31	COMMON
	DWH31	COMMONR
	DWH31	FS
	DWH31	ISMS_UPLOAD
	DWH31	ISMS_UPLOAD_SMS
	DWH31	ISMSR
	DWH31	MDKA
	DWH31	PMK_MASTER
	DWH31	PMK_SRS
	DWH31	PRF

DWH31 SMS

## Cloud Migration 결과

#### [DATABASE]

- On-premises (43) -> Cloud(20)
- 총 23개 database 정리

#### [TABLE]

- On-premises (3013) -> Cloud(2480)
- 약 530개 table 정리

#### [결과]

• 오래동안 관리가 되지 않은 Database와 Table정리를 통하여 서버를 쾌적하게 관리, 운영할 수 있도록 진행

atabase	
ON	
ONR	
PLOAD	
PLOAD_SMS	
ASTER	
S	

SQL10

SQL10

ReportServerTempDB


TMP POS



## 3-2. 클라우드 이관에 따른 연결정보 변경 - CORIA DW & Power BI Connection 결과

#### [1] CORIA DW - SSIS package 수정

On-Premises의 데이터를 집계하여 CORIA Data Warehouse를 만드는 경우를 분석하여 Cloud로 수정

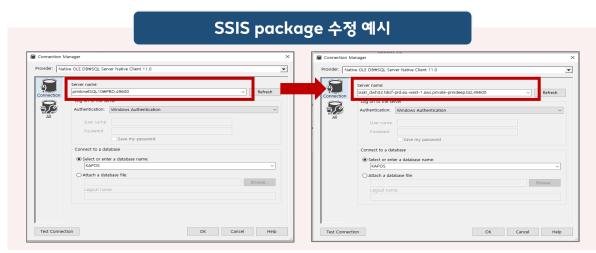

#### SSIS 수정 결과


#### [결과]

- CORIA DW를 만드는 SSIS package의 개수는 46개
- 이 중 On-premise에서 데이터를 활용하는 것은 20개로 20개 전부 Cloud 소스로 변경 후 운영, 모니터링 진행

#### [2] Power BI Connection 수정

다음 Power BI 파일에서는 On-Premises의 데이터를 바라보고 있어서 Cloud 데이터를 바라볼 수 있도록 수정

- ILUMA & TEREA Dashboard II.pbix
- PMK\_ARSReport\_ILUMA.pbix



#### 수정 결과

#### [결과]

- 데이터 변환 옵션을 이용하여 원본으로 가져오는 서버 주소를 변경 후 BI 운영 모니터링 진행
- #ILUMA & TEREA Dashboard II총 29개소스 변경
- #PMK\_ARSReport\_ILUMA총 8개소스중에 4개 변경



#### 3-3. Power BI 개발 - SSRS Report to Power BI 결과

#### 기존 리포트 분석

 SQL10, iSMS 서버에서 데이터를 가져와서 보여주는 SSRS report와 SMART 분석

#### DW 개발

• Cloud CORIA 서버에 기존 쿼리를 바탕으로 Data Warehouse 개발 진행

#### Power BI 개발

• 기존 보고서와 동일한 포맷으로 Power BI 개발 진행

#### 개발 배경

• SMART 솔루션에서 활용한 판촉 활동 조회 페이지와 SSRS Report 리포트들을 클라우드 서버에서의 데이 터로 유연하게 확인할 수 있도록 개발

## 개발 성과

• 8시 - 18시 시간 제한 없이 보고서를 볼 수 있으며 권한별로 해당되는 데이터만 기본적으로 보여지고, 필터 선택에 따른 반응형 보고서 개발


## 활용 대상

• 일마감된 자료들을 파악하고 사원별 진척율을 확인하 고자 하는 인원

## 개발 방식

 기존 SSRS에서 사용된 코드를 분석하여 ISMS 서버의 데이터를 CORIA Cloud 서버에 축적하여 Power BI 로 시각화

#### (Link) Power BI ISMS Report\_PBI

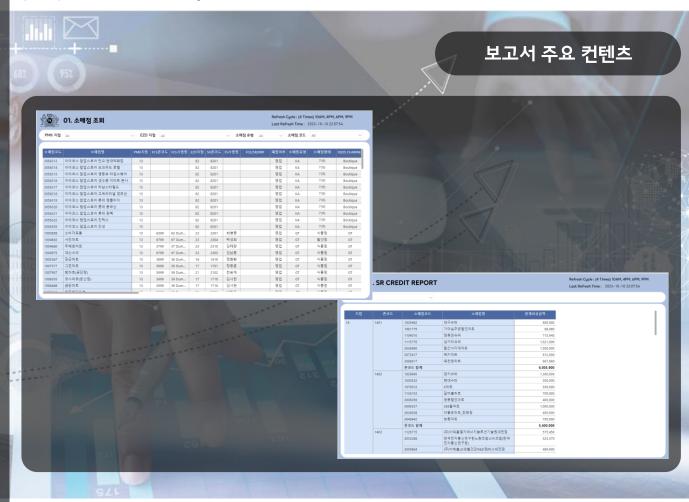



#### 3-4. 프로젝트 산출물 공유 / 인수인계

❖ 프로젝트를 수행함에 있어 상시로 관리되는 산출물을 Teams의 Team Site 채널에 업데이트하여 지속적으로 공유/관리가 진행되었으며, 최종적으로 실무부서 담당자에게 산출물(Document 대상)을 기준으로 Knowledge Transfer를 진행하며 프로젝트에 대한 결과를 공유하고 인수인계를 진행하였습니다.

#### 프로젝트 산출물 관리 (기술 이전 및 인수인계 포함)

# | Base Date : 2023-10-06 | Base Date : 2023-10

Migration Check List

#### Migration UAT List




#### Migration 유지보수 가이드



Data Warehouse 작업정의서



Entity Relationship Diagram 정의서(예시)



BI Report 배경화면 적용(예시)



15



#### 3-5. 사후 관리 방안 및 제언

- ❖ 프로젝트 진행 과정에서 발견한 사항에 있어서 사후 관리 방안을 다음과 같이 전달드립니다.
  - 1. GETDATE() 함수
    - ✓ 기존 On-Premises에서는 KST time zone이 기준이었으나 클라우드에서는 UTC time zone이 기준
    - ✓ 이에 따라서 GETDATE()함수의 결과 날짜가 달라지게 되며, 추후 time zone이 또 변경될 경우를 대비 필요
    - ✓ 데이터 insert할 때 시간 조건을 활용하는 경우 (필수적으로)

GETDATE() => DATEADD(Hour, +9, GETUTCDATE())

위와 같이 시간을 UTC time zone을 기준으로 활용하는 것을 안내

- 2. Schema 관리 방안
  - ✓ End-User가 DB에 직접 테이블을 만드는 경우기본 스키마인 dbo가 아닌 특정 스키마를 지정하여 사용한다면 다음과 같은 이점이 있을 수 있습니다.
    - dbo 스키마는 일반적으로 시스템 관리자, DB 관리자만 컨트롤하고 유저는 특정 스키마만 컨트롤할 수 있어 보안 강화
    - 다른 스키마를 사용하면, 유저의 테이블을 식별하기에 용이

Specialized Consulting Firm in Data & Al Cloud System

Data & BI

Big Data & AI

Data Flow & Automation

Data Infra & Security

# Thank You

T. 02.552.9700

E. info@mcloudbridge.com

H. www.mcloudbridge.com

## 데이터에 가치를 더하여 고객의 성장에 공헌합니다.

Specialized Consulting Firm in Data & Al Cloud System
